


### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	01/12/2017	31/12/2017	30
2	B	ESAME DEGLI ENTI E ACQUISIZIONE DEI PARERI NECESSARI	31/12/2017	30/01/2018	30
3	C	Cameretta di monte	30/01/2018	19/02/2018	20
4	D	Attraversamento mediante spingitubo	19/02/2018	11/03/2018	20
4	D	Cameretta intermedia e tubazione valle	11/03/2018	31/03/2018	20
5	E	Raccordo Rio Chioccale	11/03/2018	21/03/2018	10
6	E	Pulizia canale raccolta	21/03/2018	31/03/2018	10

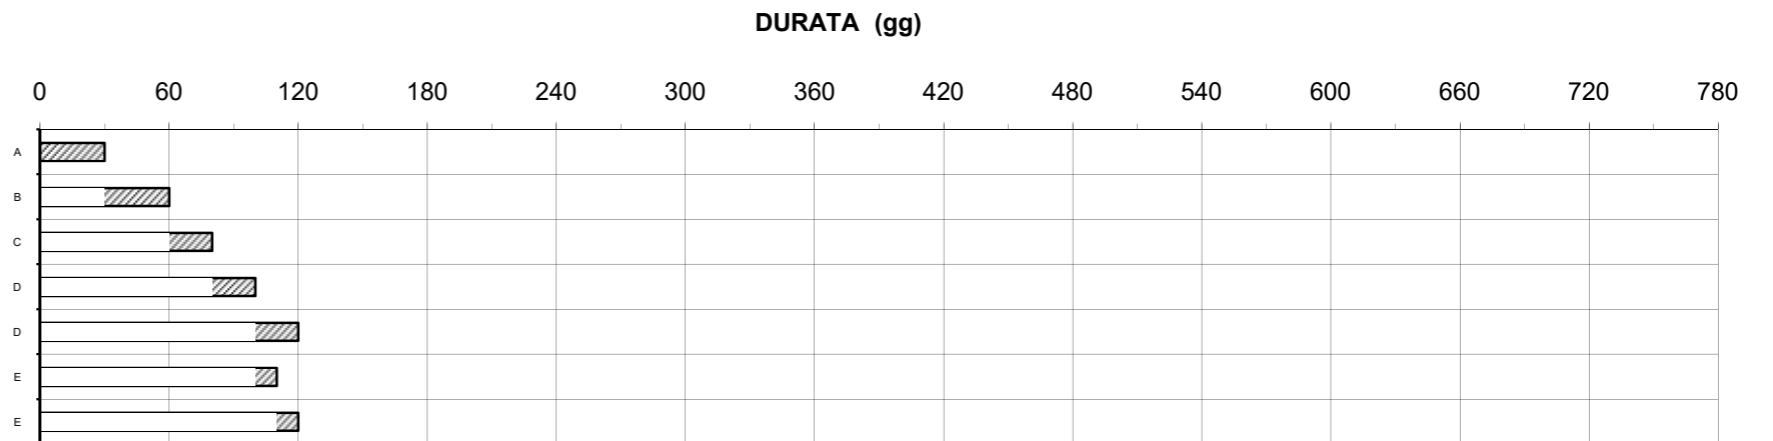

**TOTALE 120** naturali consecutivi
